

袋井市静岡モデル防潮堤整備事業（袋井幸浦の丘プロジェクト）





- :R4市盛土工箇所(実績) L=586m
- :R5市盛土工箇所(予定)L=502m
- :県施工済箇所

「袋井市静岡モデル」全体事業概要

計画延長 L=5.35km
 計画期間 概ね10年間(市施工:H26年度からR5年度まで)
 ※県施工はR7年度完了予定
 計画土量 約80万m³(市が施工:砂丘造成盛土)
 計画高 標高12m(レベル2の津波高に対応)
 【市施工:標高10m 県施工:標高12m】

「海岸防災林造成事業」との連携

県の実施する「海岸防災林造成事業」と市の実施する「袋井市静岡モデル防潮堤整備事業」と連携して実施しています。

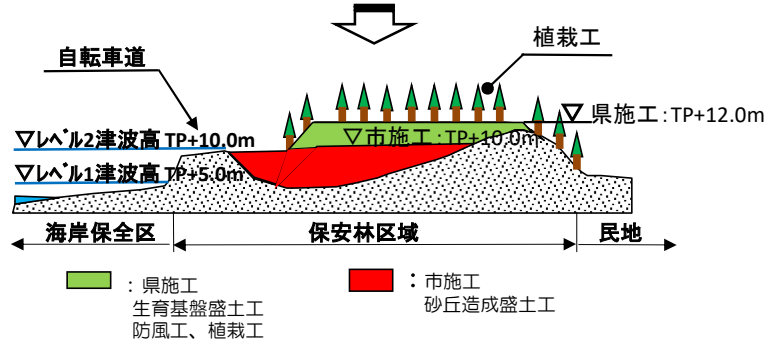

盛土進捗状況

| 【袋井市】 TP10mまで | 全体計画 | 施工済 (R4迄) | R5 (予定) | 残 |
|------------------|-------|--------------|------------|---|
| 延長(m) | 5,350 | 4,848 | 502 | 0 |
| 進捗率(%) | | 91% | 100% | |

| 【静岡県】 TP12mまで | 全体計画 | 施工済 (R4迄) | R5 (予定) | 残(~R7) |
|------------------|-------|--------------|------------|--------|
| 延長(m) | 5,350 | 4,125 | 746 | 479 |
| 進捗率(%) | | 77% | 91% | |

① 湊東地区



② 同笠地区



③ 大野地区



④ 中新田地区

