




新たな袋井西コミュニティセンター 新築工事の進捗状況をお知らせします

～令和2年秋の新建物オープンを目指します～

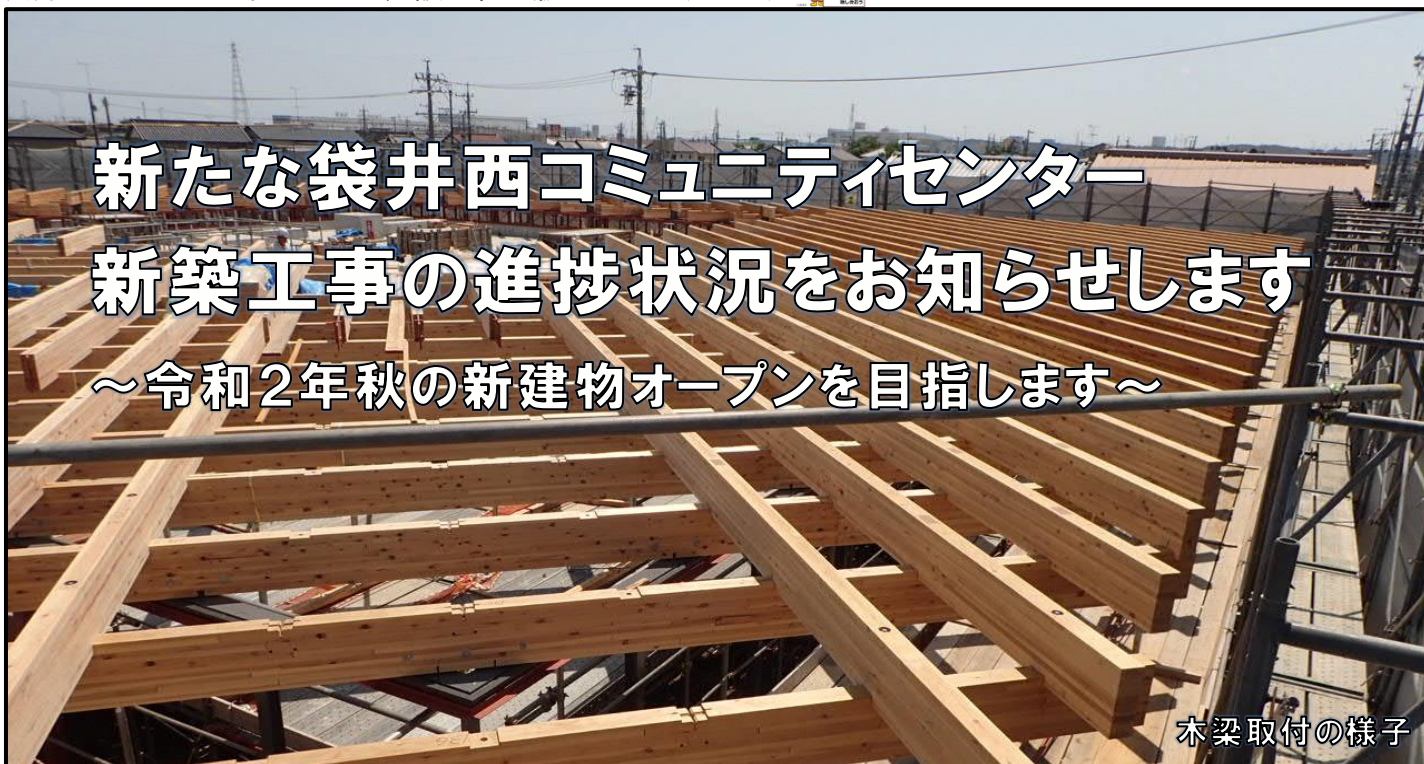

木梁取付の様子

袋井西コミュニティセンター新築工事では、建物の特徴でもある大きい軒下空間を形成する木構造部（木梁）の取付が完了し、内装工事などを進めています。

工期を延長します

令和元年9月から袋井西コミュニティセンターの新築工事を行ってきましたが、新型コロナウイルス感染症予防対策等による建築資材の調達遅延の影響により、下表のとおり、工事完成期日を1カ月程度、延長することとなりましたのでお知らせします。

工事内容	工事完成期日（予定）	
	変更前	変更後
建物工事	令和2年8月9日	令和2年9月10日
全体工事（駐車場、外構含む）	令和2年12月18日	令和3年1月29日



今後のスケジュール（予定）

令和2年10月上旬のプレオープン、令和3年2月上旬～中旬のグランドオープンを目指して、工事を進めています。袋井西コミュニティセンターの建設を記念して、落成式や市民（地域住民）を対象とした施設内覧会を予定しています。

令和2年9月26日（土）AM

落成式（完成式典）

令和2年9月26日（土）PM・27日（日）

施設内覧会

令和2年10月1日（木）

新建物オープン（新建屋供用開始）

令和3年2月上旬～中旬

全施設オープン（建物、駐車場、外構等）

発行・お問い合わせ

袋井市役所 総務部 協働まちづくり課 コミュニティ推進室
TEL:0538-44-3107 FAX:0538-43-2132
E-mail:shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp

